


Project Management

Launching/Executing Process Group

Marco A. Boschetti


Università di Bologna



Launching/Executing Process Group

Sommario

- Tools, templates e processi per avviare ed eseguire un progetto
- Recruiting the project team
- Conducting the project kick-off meeting
- Regole operative per il team
- Gestione dei cambiamenti di scope
- Gestione delle comunicazioni
- Assegnamento delle risorse
- Resource-leveling strategies
- Finalizzare la schedula del progetto
- Scrivere i work packages



Tools, templates e processi

- Recruiting/staffing del Project Team (processo)
- Project Definition Statement (template)
- Regole operative per il team (Team Operating Rules):
 - Problem Solving (tool, template e processo)
 - Decision Making (tool)
 - Conflict Resolution (tool)
 - Consensus Building (tool)
 - Brainstorming (processo)
 - Team Meetings (tool)
- Gestione del processo di modifica dello Scope (template e processo)
- Communications Management Planning (processo)
- Work Packages (tool e template)
- Resource assignment (processo)
- Raffinamento della schedula del progetto (template e processo)

Project Team

Un **project team** è un gruppo di professionisti impegnati a raggiungere degli obiettivi comuni, che dovrebbero essere affiatati tra loro per lavorare bene assieme, relazionandosi direttamente e apertamente per fare ciò che è stato stabilito.

I membri del project team in sintesi possono essere così classificati (e scelti):


- Co-Project manager – developer (scelto prima della fase di Scoping)
- Co-Project manager – client (scelto prima della fase di Scoping)
- Core team (scelto prima della fase di Planning)
- Developer team (scelto prima della fase di Launching)
- Client team (scelto prima della fase di Launching)
- Contracted team (scelto nella fase di Launching)



Caratteristiche del Core e Developer Team

I membri del team, in particolare del core team e del team che svilupperà la soluzione, dovrebbero avere le seguenti caratteristiche:

- Impegno
- Condivisione delle responsabilità
- Flessibilità
- Task-oriented
- Abilità a lavorare entro i tempi e i vincoli previsti
- Propensione a concedere fiducia e supporto reciproco
- Team-oriented
- Open-minded
- Abilità a lavorare in ambienti strutturati rispettando le gerarchie
- Abilità a usare strumenti per il project management



Gli altri membri del Team

Client Team Members

- Devono comprendere i processi della loro business unit.
- Devono essere in grado di prendere decisioni e impegni per conto della loro business unit.

Contract Team Members

- Potrebbero non essere sempre disponibili quando sono necessari.
- Dovrebbero conoscere come i task assegnati sono relazionati con gli altri task e l'intero progetto.
- L'impegno può essere un problema.
- La qualità del lavoro svolto può essere scarsa.
- Richiedono una supervisione più stretta rispetto al core team.

Bilanciamento di un team

Trovare il giusto bilanciamento nella composizione di un team è un “fattore critico di successo”.

In letteratura sono state proposte numerose tecniche per misurare e stabilire il giusto bilanciamento.

Per esempio, David Kolb ha proposto la seguente classificazione in termini di “learning style”:

- Assimilating
- Diverging
- Accommodating
- Converging

Bilanciamento di un team

Assimilating

- Gli assimilatori sono molto bravi a raccogliere e rappresentare i dati in modo brillante. Preferiscono fornire dei modelli che descrivono la realtà da una prospettiva “più larga”.
- Si focalizzano su idee e concetti piuttosto che sulle persone e gli aspetti pratici. Non sono individui orientati ai risultati.

Diverging

- Sono individui che hanno una naturale propensione a individuare alternative e vedono le diverse situazioni da molteplici prospettive.
- Tendono più ad osservare che ad agire. Preferiscono il brainstorming all'azione.
- Possono fornire al team di sviluppo dei punti di vista originali, non convenzionali (outside-of-the-box), che possono permettere al team l'individuazione di approcci alternativi.


Bilanciamento di un team

Accommodating

- Sono individui orientati ai risultati, che preferiscono l'azione. Si adattano facilmente in base alle circostanze.
- Tendono a relazionarsi con gli altri per decidere le loro azioni, piuttosto che impiegare analisi tecniche.
- La loro azione è molto positiva per il team.

Converging

- Sono individui orientati ai risultati. Preferiscono individuare le soluzioni che la loro effettiva implementazione.
- Non sono particolarmente orientati alla collaborazione con gli altri membri e preferiscono lavorare ad attività e problemi tecnici.
- Sono molto abili a individuare la migliore opzione tra diverse alternative. Guidano il team alla scelta del giusto approccio.



Cosa rende efficace un team


Le principali caratteristiche, che permettono a un team di essere efficace, sono le seguenti:

- Qualità
- Flessibilità
- Coordinamento e cooperazione
- Soddisfazione dei membri
- Crescita professionale
- Possesso delle abilità e competenze necessarie
- Produttività

Dove un team può migliorare

Nei processi di miglioramento continuo di un'azienda dovrebbe essere posta particolare attenzione ai seguenti aspetti:


- Metodi e procedure di lavoro
- Conoscenza delle tecnologie più appropriate per l'implementazione delle soluzioni
- L'uso di servizi e prodotti di qualità
- Decision making
- Supervisione
- Supporto allo staff
- Attrarre e fidelizzare
- Tasso di uscita (per ridurlo il più possibile)
- Flessibilità nella composizione del personale



Responsabilità dei membri del team

Tutti i membri del team hanno delle precise responsabilità, in particolare nei seguenti ambiti:

- Comunicazione
- Attitudine all'ascolto
- Condivisione degli obiettivi
- Atteggiamento positivo
- Creatività
- Rispetto degli altri
- Crescita e apprendimento




Kick-Off Meeting Agenda

Il Project Kick-Off Meeting provvede ad annunciare che il progetto pianificato è stato approvato per la fase esecutiva.

La riunione per il kick-off solitamente si risolve in un solo incontro e serve essenzialmente per far incontrare i “partecipanti”.


L’agenda dovrebbe avere la seguente struttura:

- Introduzione
- Presentazione dello sponsor al team di progetto
- Presentazione degli aspetti rilevanti del progetto da parte dello sponsor
- Presentazione del progetto (committente)
- Presentazione del progetto (project manager)
- Presentazione dei membri del team di progetto
- Definire il Project Definition Statement (preparato durante lo scoping e il planning)



Kick-Off Meeting Agenda


- Stabilire le regole operative del team
 - Problem solving
 - Decision making
 - Conflict resolution
 - Consensus building
 - Brainstorming
 - Team meetings
- Integrare nella schedula le disponibilità dei membri del team
- Identificare e scrivere i Work Packages



Project Definition Statement

Come abbiamo già detto, il PDS è una versione estesa del POS a uso del team di progetto. In particolare ha i seguenti impieghi:

- E' una buona base per la pianificazione del progetto;
- Chiarisce al team in cosa consiste il progetto;
- E' un riferimento importante per consentire al team di rimanere focalizzati sulla corretta direzione;
- E' un punto di riferimento per i nuovi membri del team;
- Consente al team di approfondire ed eventualmente individuare nuovi aspetti importanti per il successo del progetto.



Matrice di assegnazione responsabilità

Delegare e assegnare correttamente le responsabilità è un fattore di successo per la gestione dei progetti.

Si possono seguire diversi schemi⁽¹⁾ e un esempio è la matrice **RASCI**:

Responsible = Responsabile dell'attività e del suo completamento con successo

Accountable = Incaricato dell'approvazione del risultato dell'attività

Support = Risorsa assegnata per supportare il responsabile

Consulted = Disponibile per assistere il responsabile

Informed = Membro che deve essere tenuto informato sullo stato di avanzamento

(1) Per conoscere altre alternative: https://en.wikipedia.org/wiki/Responsibility_assignment_matrix

Matrice di assegnazione responsabilità


Esempio di template

RASCI Matrix

RASCI Matrix

Project Name: ...	Responsible: ...			Accountable: ...			
	Team Member	Team Member	Team Member	Team Member	Team Member	Team Member	Team Member
Task Name 1			C	A	I	I	R
Task Name 2	I			A	S	S	
Task Name 3		A	I	R	A	I	
Task Name 4	S			R	S		
Task Name 5	I	A	I		S	S	
Task Name 6				R	A		
Task Name 7	A			R			
Task Name 8	A		C				R

R = Responsible
A = Accountable
S = Supportive
C = Consulted
I = Informed



Regole operative per il team

Stabilire le regole operative per il team di progetto è fondamentale per concordare i processi che devono essere eseguiti.

Gli aspetti che devono essere regolamentati sono i seguenti:

- Problem solving
- Decision making
- Conflict resolution
- Consensus building
- Brainstorming
- Team meetings

Regole operative per il team

Problem solving


Il processo di problem solving può essere strutturato in diversi modi.

Un esempio sono “i cinque passi” suggeriti da Daniel Couger:

- Definire il problema e il “proprietario” (owner)
- Raccogliere i dati rilevanti e analizzare le cause
- Generare delle idee
- Valutare e assegnare una priorità alle idee
- Sviluppare un piano d’azione

A cui segue l’implementazione della soluzione e la verifica del risultato ottenuto.

Se la soluzione non è soddisfacente, il processo può essere ripetuto.

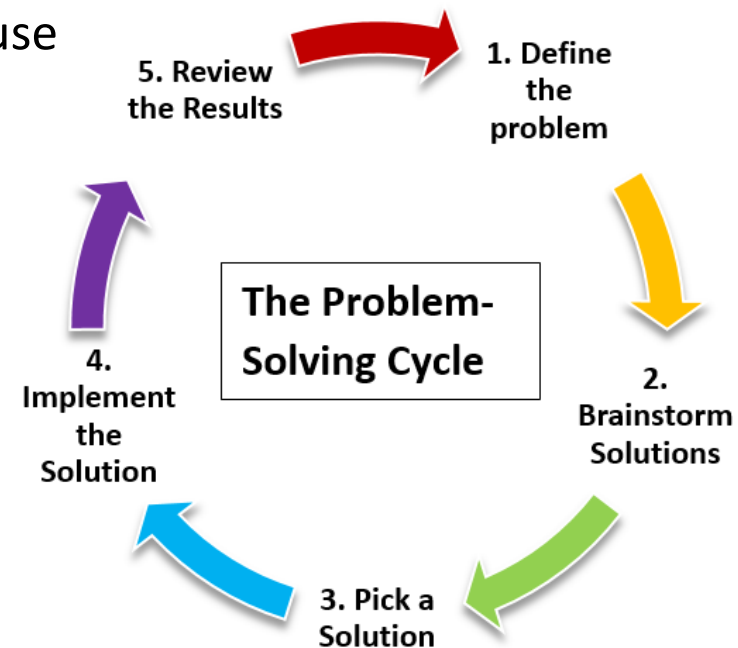

Regole operative per il team

Decision making

Il processo di decision making è pervasivo:

- Cosa deve essere fatto e dove? (Scope)
- Perché dovrebbe essere fatto? (Justification)
- Quanto bene deve essere fatto? (Quality)
- Quando è richiesto? In quale sequenza? (Schedule)
- Quanto costerà? (Budget/Cost)
- Quali sono le incognite? (Risk)
- Chi dovrebbe fare il lavoro? (Human Resource)
- Come dovrebbero essere organizzate le persone all'interno del team? (Communication/Interpersonal Skills)
- Come sapremo? (Information Dissemination/Communication)

Regole operative per il team

Decision making styles

Il processo di decision making può seguire principalmente tre approcci alternativi:

- Directive: la persona che detiene la responsabilità/autorità prende tutte le decisioni per tutti i membri del team. Per esempio, potrebbe essere il project manager per decisioni riguardanti il progetto o il “task manager” per i singoli task.
- Participative/Collaborative: ogni membro del team partecipa al processo decisionale (decision-making). La sinergia tra i membri del team consente di individuare la migliore decisione e aumenta il loro coinvolgimento.
- Consultative: costituisce la soluzione di compromesso, in cui la persona che detiene la responsabilità/autorità prende la decisione, ma dopo aver raccolto informazioni e idee dai membri del team.


Regole operative per il team

The Six Phases of the Decision-Making Process by Wysocki

PHASE	DESCRIPTION	LEARNING STYLE
Phase I: Situation	Discovery phase. The team investigates, discusses, clarifies, and defines the situation. It is important for definition the team to understand the root causes and evidence that led to the need for a decision.	Assimilator
Phase II: Situation	Continuation of Phase I. Characterized by brain-storming and searching for new ideas and alternatives decision for resolving the situation, which should lead to generation better options for the decision. Above all, the team needs to avoid a rush to judgment.	Diverger
Phase III: Ideas to action	Define the criteria for evaluating the alternative decisions. This involves identifying the advantages and disadvantages of each alternative. Whatever approach is used, the result should be a ranking of alternatives from most desirable to least desirable.	Converger
Phase IV: Decision	Begins once the alternative is chosen. This is the planning phase for the project team. The team action plan determines tasks, resources, and timelines that are required to implement the decision. This phase requires a concerted effort to obtain buy-in from all affected parties.	Converger
Phase V: Decision	Learning opportunity for the project team. The team identifies what did and did not work, as well as areas evaluation in which it can improve and how to do so. The value planning of this discussion lies in the team's willingness to be honest and straightforward with one another.	Accommodator
Phase VI: Evaluation	Focuses on the quality of results. The team evaluates the situation: Was the situation improved satisfactorily, of outcome or will another round be required? Was the situation and process defined correctly, or is revision required? Did the process work as expected, or will it need adjustment for the next attempt?	Assimilator

Regole operative per il team

Conflict Resolution

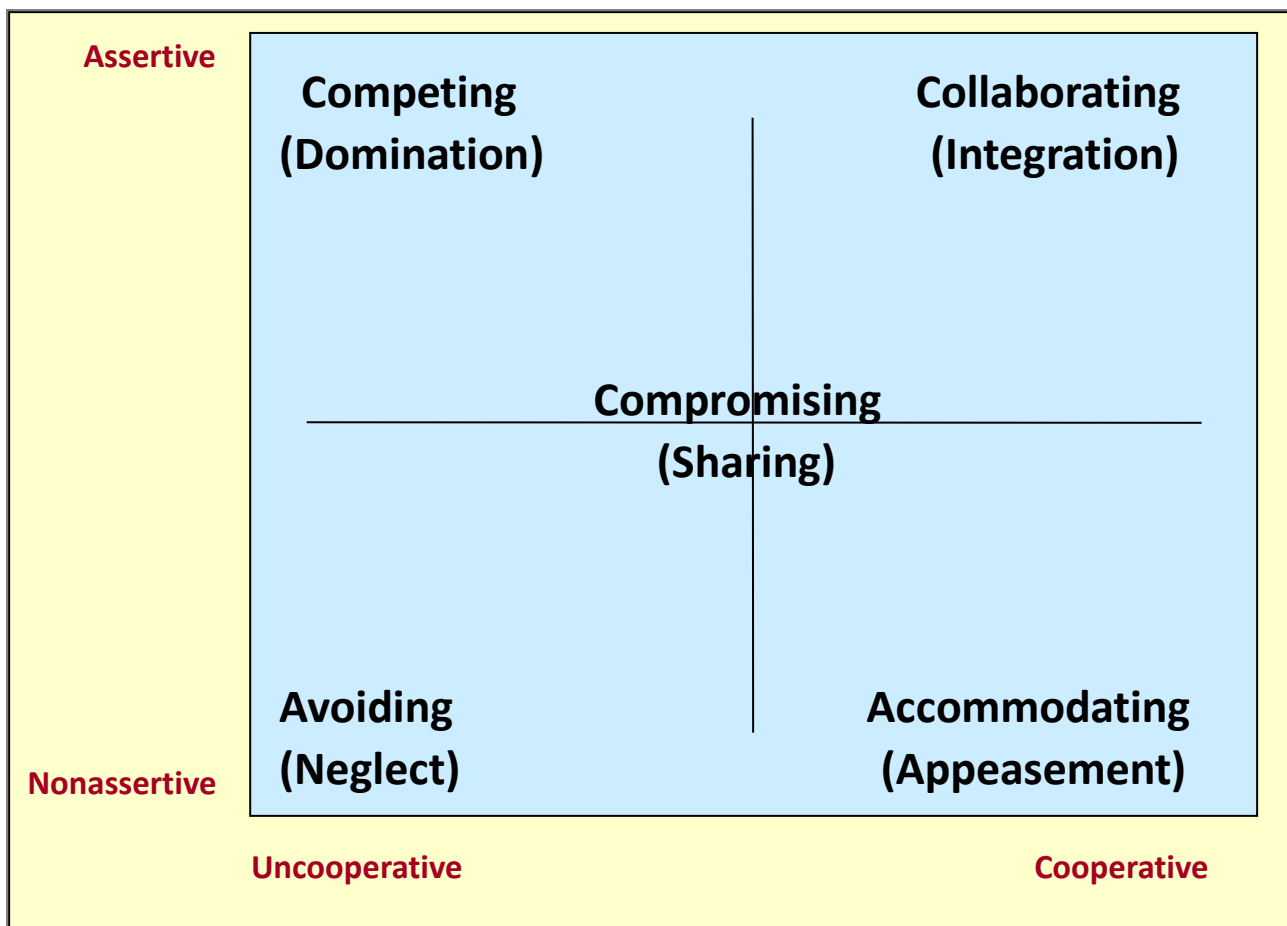

Regole operative per il team


Consensus Building

Be careful!!!

A consensus decision that equally satisfies all parties may be a bad decision after all.

Warning by Wysocki






Regole operative per il team

Brainstorming Method

Si ricorre al “brainstorming” per individuare delle soluzioni che difficilmente un singolo può identificare. Lavorando in gruppo si possono identificare più soluzioni e scegliere la migliore.

Aspetti fondamentali del brainstorming:

- Riunire chi ha conoscenza dell’ambito in cui si riscontra il problema;
- Mettere sul tavolo tutte le idee;
- Continuare il processo finché non si esauriscono le idee;
- Discutere tutte le idee che sono emerse;
- Durante il processo di discussione la soluzione inizia a emergere;
- E’ necessario testare tutte le idee con estrema apertura mentale.




Regole operative per il team

Team Meetings

Le riunioni tra i membri del team sono uno strumento indispensabile nella fase di esecuzione.

Per la loro organizzazione bisogna rispondere alle seguenti domande:

- Qual è lo scopo della riunione?
- Quanto spesso bisogna riunirsi? Per quanto tempo?
- Chi dovrebbe partecipare?
- C'è bisogno di un'agenda?
- Deve essere redatto un verbale? Chi lo scrive? Chi lo deve consultare?




Regole operative per il team

Guidelines for Managing Meetings

Before the Meeting:

- Ci si deve chiedere se la riunione è necessaria;
- Determinare lo scopo della riunione;
- Stabilire le regole di base per la discussione;
- Determinare chi davvero deve partecipare e invitare solo questi membri (inutile far perdere tempo a chi non è necessario);
- Preparare delle note e la presentazione;
- Stabilire la data e la durata della riunione, che dovranno essere rispettate con la massima puntualità.




Regole operative per il team

Guidelines for Managing Meetings

During the Meeting:

- Ribadire la durata della riunione e rispettarla (la durata deve essere specificata quando avviene la convocazione);
- Identificare obiettivi specifici;
- Raccogliere gli input dai partecipanti;
- Non fossilizzarsi su alcune posizioni;
- Aiutarsi con ausili visivi;
- Periodicamente riassumere i risultati raggiunti dalla discussione in termini di consenso acquisito o disaccordo ancora non risolto;
- Assegnare a ciascun membro del team delle possibili azioni.




Regole operative per il team

Guidelines for Managing Meetings

After the Meeting:

- Fissare quando e dove si farà la prossima riunione e stabilire la possibile agenda;
- Quando viene fissata la data e il luogo della prossima riunione, stabilire anche chi deve partecipare, specificando il ruolo (sia nella riunione che nel progetto);
- Riportare gli argomenti in agenda effettivamente discussi;
- Riportare le decisioni prese o quelle ancora in sospeso perché richiedono ulteriori approfondimenti;
- Definire le azioni da intraprendere e i responsabili che dovranno garantire l'esecuzione e riportare l'esito al team nella prossima riunione.




Regole operative per il team

Project Meetings

Possono essere identificate tre tipologie base di riunioni:

- Daily status meetings;
- Problem resolution meetings;
- Project review meetings.




Regole operative per il team

Daily Status Meetings

Le riunioni giornaliere servono per monitorare lo stato di avanzamento dei task del progetto.

- Devono avere una breve durata: 15 minuti;
- Si può fare senza sedersi in una sala riunioni;
- Si parla solo dei task aperti su cui si sta lavorando e che ancora non sono stati completati;
- Ogni responsabile di un task riporta lo stato di avanzamento:
 - “Sono in schedula”;
 - “Sono in ritardo di x ore, ma prevedo di rientrare in schedula entro y giorni” (possibilmente 1-2 giorni);
 - “Sono in ritardo di x ore e ho bisogno di aiuto per recuperare”;
 - “Sono in anticipo di x ore e posso aiutare chi ha bisogno”.




Regole operative per il team

Problem Resolution Meeting Agenda

I problemi non devono essere risolti nelle riunioni giornaliere, ma in riunioni specifiche.

In queste riunioni per la risoluzione di un problema:

- Partecipa solo chi è coinvolto nel problema;
- Si determina chi è il “proprietario” (owner) del problema;
- Si deve identificare la soluzione;
- Si deve determinare come e quando potremo stabilire che il problema è risolto.



Regole operative per il team

Project Review Meetings

Queste riunioni sono eventi formali, che si tengono in concomitanza con il raggiungimento di una milestone. Durante questi eventi:

- Si svolge la presentazione dello stato del progetto in corrispondenza della milestone e si svolge una sua revisione critica;
- Partecipano il project manager, il senior management, il committente, lo sponsor, gli stakeholders e alcuni tecnici esperti dell'ambito di progetto oggetto della milestone;
- Si presentano le performance fornite dal progetto fino a quel momento;
- Si possono proporre anche delle azioni correttive.


Regole operative per il team

Team War Room

La “War Room” è uno spazio dedicato alle riunioni necessarie durante il progetto.


- Layout fisico
- Soluzioni possibili
- Uso operativo






Gestione dei cambiamenti di scope

Processo tipico di gestione dei cambiamenti di scope

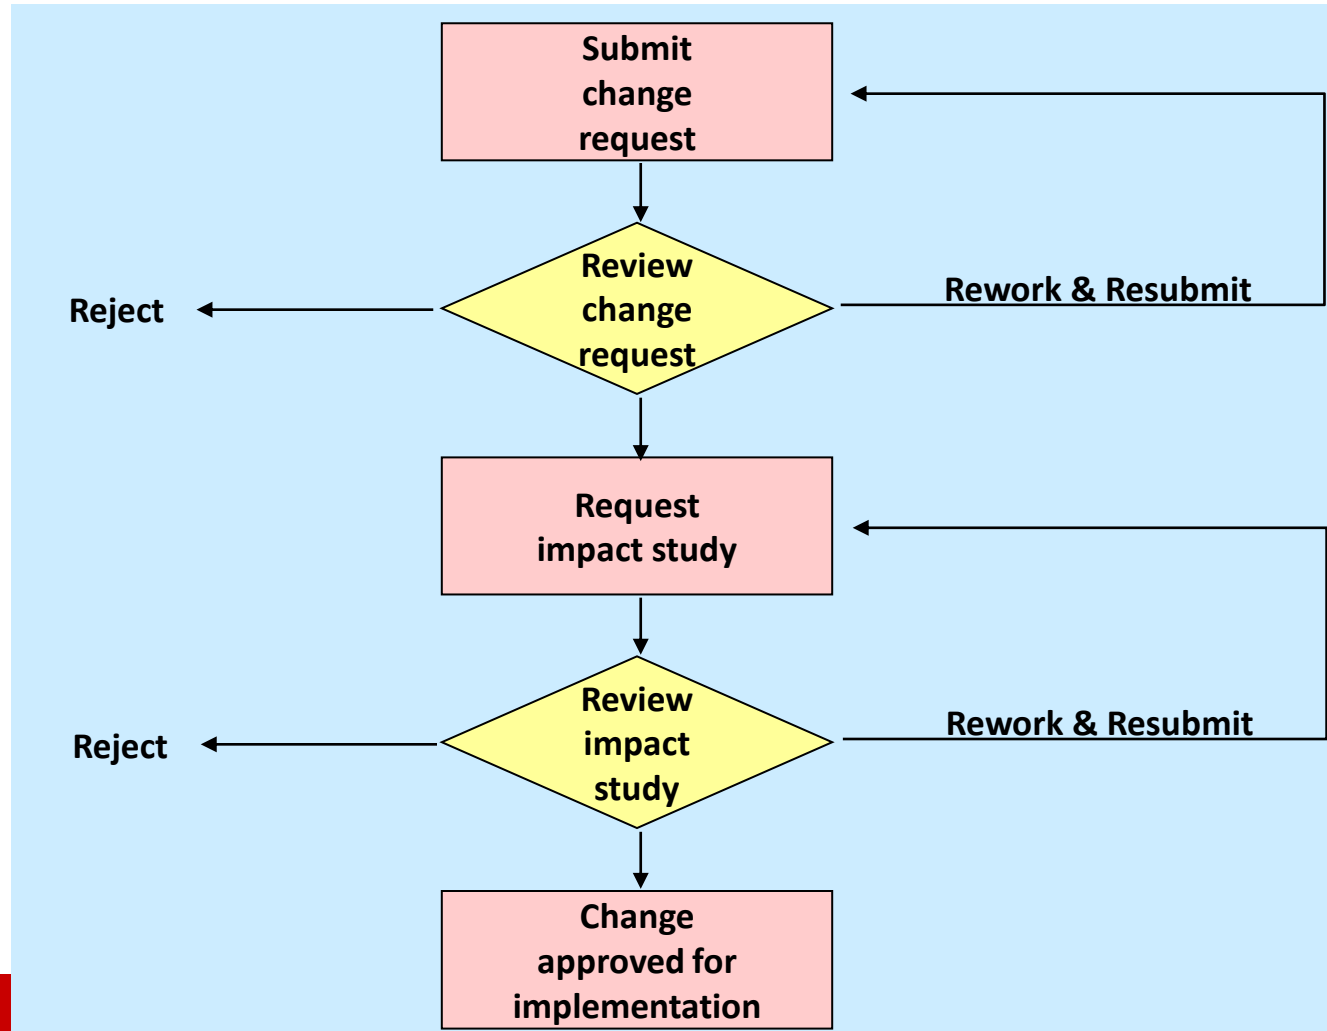




Gestione dei cambiamenti di scope

Scope Change Request Form

Project Name	
Change Requested By	
Date Change Requested	
Description of Change	
Business Justification	
Action	
Approved By	Date



Gestione dei cambiamenti di scope

Project Impact Statement

Documento preparato dal project manager, con la collaborazione del team, per definire l'impatto del cambiamento di scope sul progetto.

Deve rispondere alle seguenti domande:

- Qual è il beneficio atteso dal cambiamento?
- Come impatterà il cambiamento sui costi?
- Come impatterà il cambiamento sulla schedula del progetto?
- Come impatterà il cambiamento sulla qualità della soluzione?
- Come impatterà il cambiamento sull'allocazione delle risorse?
- Il cambiamento può essere rimandato a un successivo stadio di progetto o a una prossima versione della soluzione?
- Il progetto è in uno stato in cui è alto il rischio che il cambiamento richiesto destabilizzi la soluzione?

Gestione dei cambiamenti di scope

Project Impact Statement: Possibili Esiti

La definizione dell'impatto del cambiamento può avere i seguenti esiti:

- Il cambiamento può essere applicato entro le risorse e i tempi previsti per il progetto.
- Il cambiamento può essere applicato, ma richiederà un'estensione della schedula.
- Il cambiamento può essere applicato entro la schedula prevista, ma sono richieste ulteriori risorse.
- Il cambiamento può essere applicato, ma sono richieste ulteriori risorse e un'estensione della schedula.
- Il cambiamento può essere applicato utilizzando una strategia "multiple release", stabilendo le priorità dei deliverables e le date di rilascio.
- Il cambiamento non può essere applicato senza modifiche sostanziali del progetto.

Gestione dei cambiamenti di scope

Come aiutare il cliente a comprendere il cambiamento di scope

- Il cambiamento può essere dovuto a **cambiamenti esterni** (del mercato, delle tecnologie, etc.) oppure alla scoperta di **nuovi bisogni/requisiti** durante il progetto, che non erano emersi nella fase di scoping.
- Le richieste di cambiamento dello scope devono essere sempre messe in conto.
- Il team di progetto guidato dal project manager analizzerà **l'impatto della richiesta** di cambiamento sull'intero progetto.
- Il project impact statement definirà tutte le possibili **alternative** per soddisfare la richiesta di cambiamento.
- Assieme al committente **si sceglierà una delle alternative** individuate nel project impact statement.
- Il project manager **ristrutturerà il piano** del progetto in conseguenza della scelta effettuata e informerà il committente.

Gestione dei cambiamenti di scope

Bisogna gestire una “riserva”

- Una percentuale della durata del progetto (tipicamente del 5-10%) è “accantonata” come tempo aggiuntivo per far fronte alle contingenze (time contingency) relative all’elaborazione e all’eventuale conseguente accoglimento delle richieste di cambiamento dello scope.
- Le richieste di cambiamento possono essere processate ogni volta che emergono oppure ad ogni “ciclo” del progetto.
- La gestione della riserva può essere aiutata dall’utilizzo di una sorta di “Scope Bank” per “depositare” i requisiti (funzioni, feature, etc.) non ancora integrati nella soluzione, a cui si può assegnare anche una priorità.

Gestione delle comunicazioni


Per gestire le comunicazioni bisogna definire:

- Il “timing”;
- I contenuti;
- Scegliere i canali che consentono un’efficiente comunicazione.



Gestione delle comunicazioni

Il processo

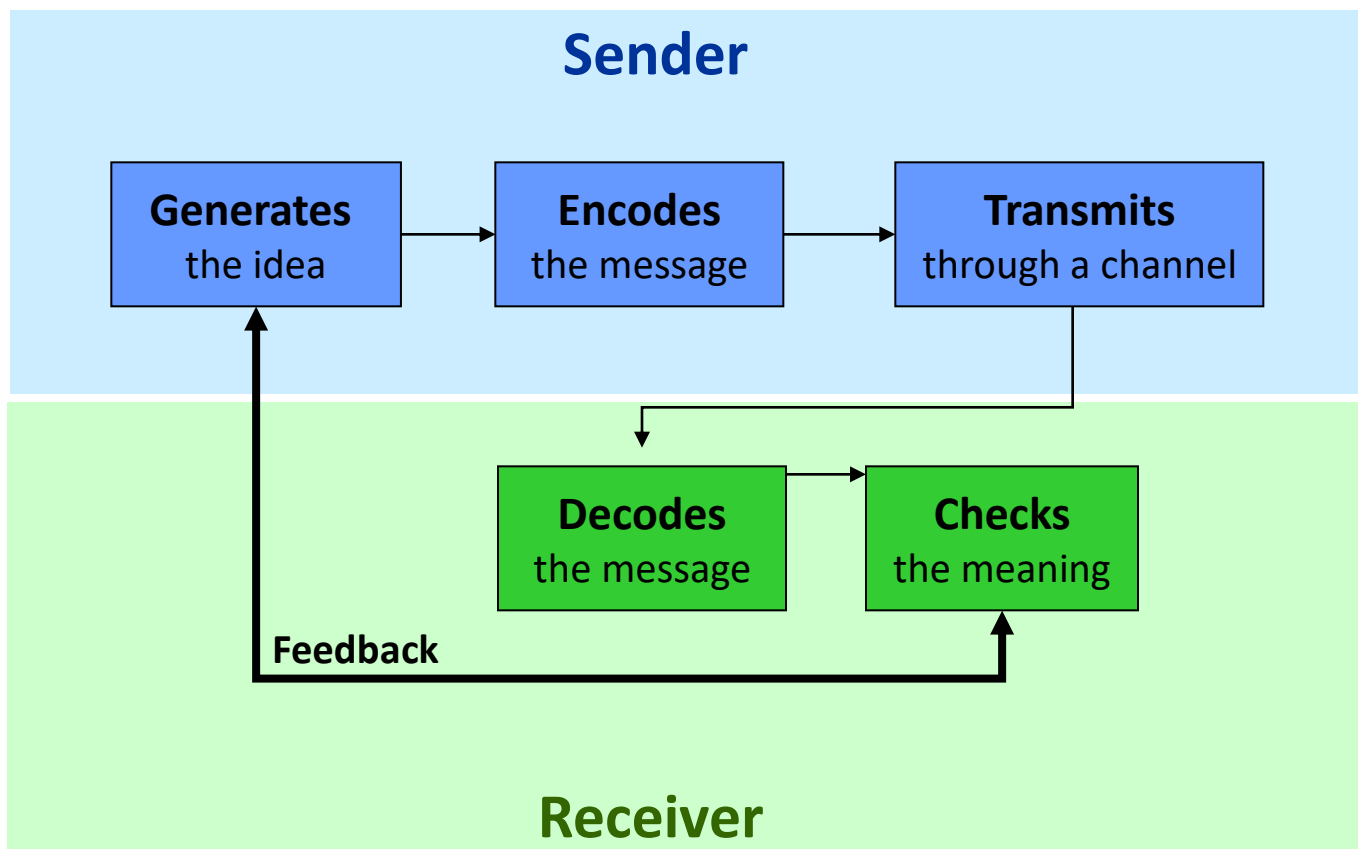

Gestione delle comunicazioni


Tipi di comunicazioni

- **One-to-one**
 - Conversazioni (di persona e al telefono)
 - Riunioni
- **Elettronica**
 - E-mails
 - Websites
 - Databases
- **Scritta**
 - Memos
 - Lettere
 - Documenti
 - Reports




Gestione delle comunicazioni


Interfacce

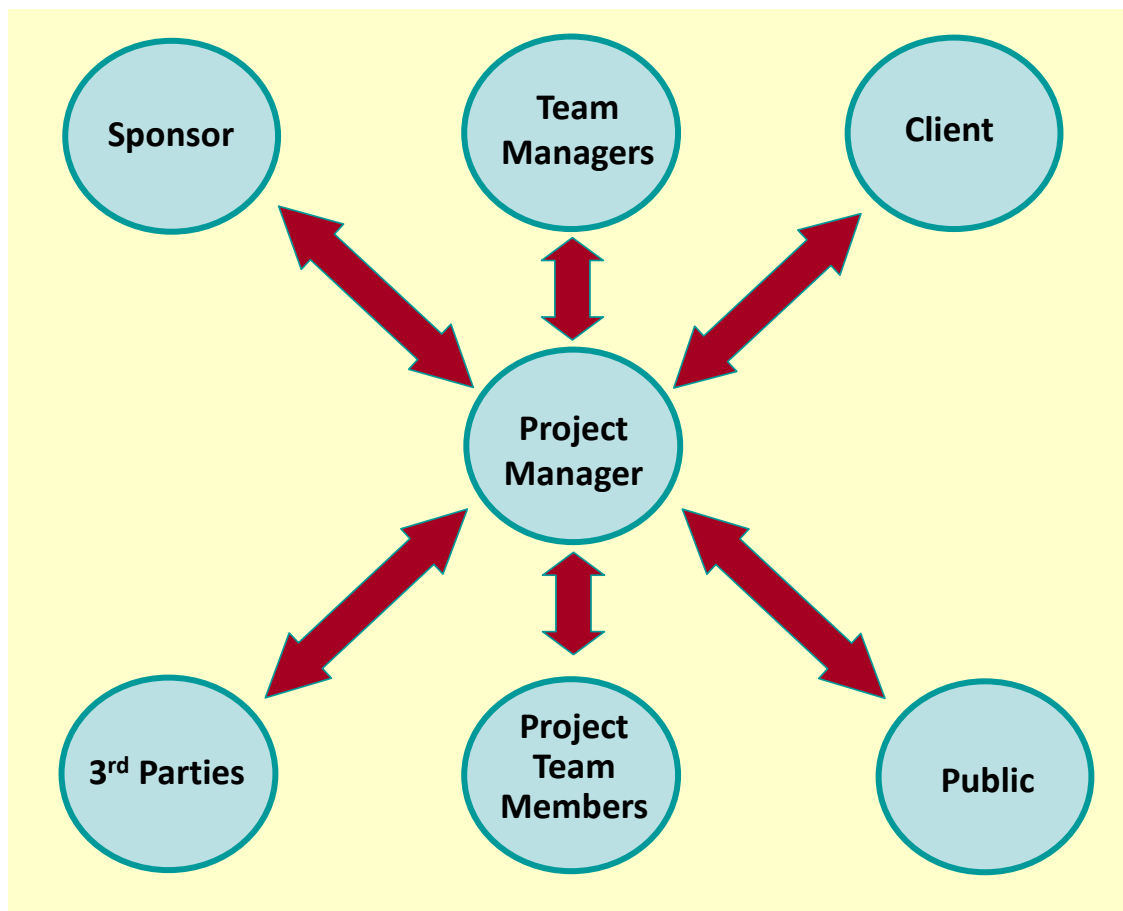

Gestione delle risorse

- Nella realtà di tutti i giorni, le risorse disponibili possono anche essere impiegate in altri progetti, pertanto è facile che qualche risorsa soffra della cosiddetta “over-allocation”.
- Per gestire al meglio le risorse disponibili, quando si presentano delle criticità si possono:
 - Utilizzare gli “slack” disponibili;
 - Far slittare la data di fine del progetto;
 - Ricorrere allo straordinario.

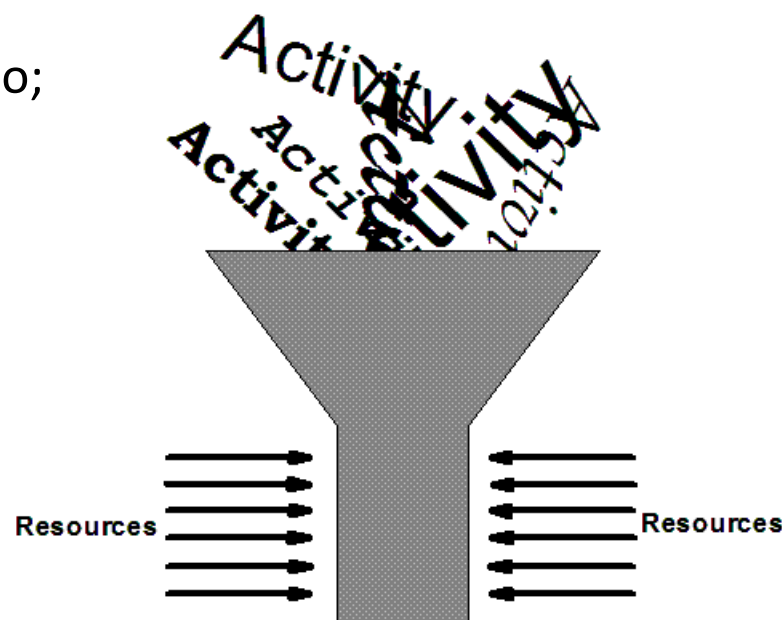




Metodi alternativi per schedulare i task

Per semplificare il problema dell'assegnamento delle risorse si può ricorrere a metodi alternativi per pianificare i task.

Tra le possibili azioni possiamo citare le seguenti:


- I task possono essere *decomposti ulteriormente*;
- Allungare la *durata* dei task (nota bene: solo la durata);
- Assegnare delle *altre risorse* in sostituzione di quelle non disponibili o non sufficientemente disponibili.

Finalizzare la schedula del progetto

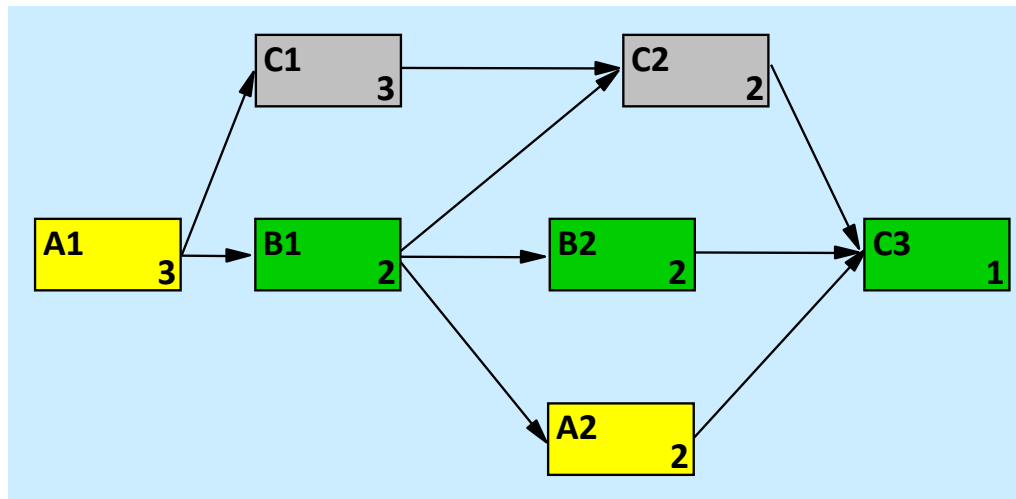

	M	T	W	R	F	S	S	M	T	W	R	F	S	S
Elena	a1	a1	a1					a2	a2					
Mario				b1	b1			b2	b2	b2				
Paolo				c1	c1			c1	c2	c2	c2	c3		

Finalizzare la schedula del progetto

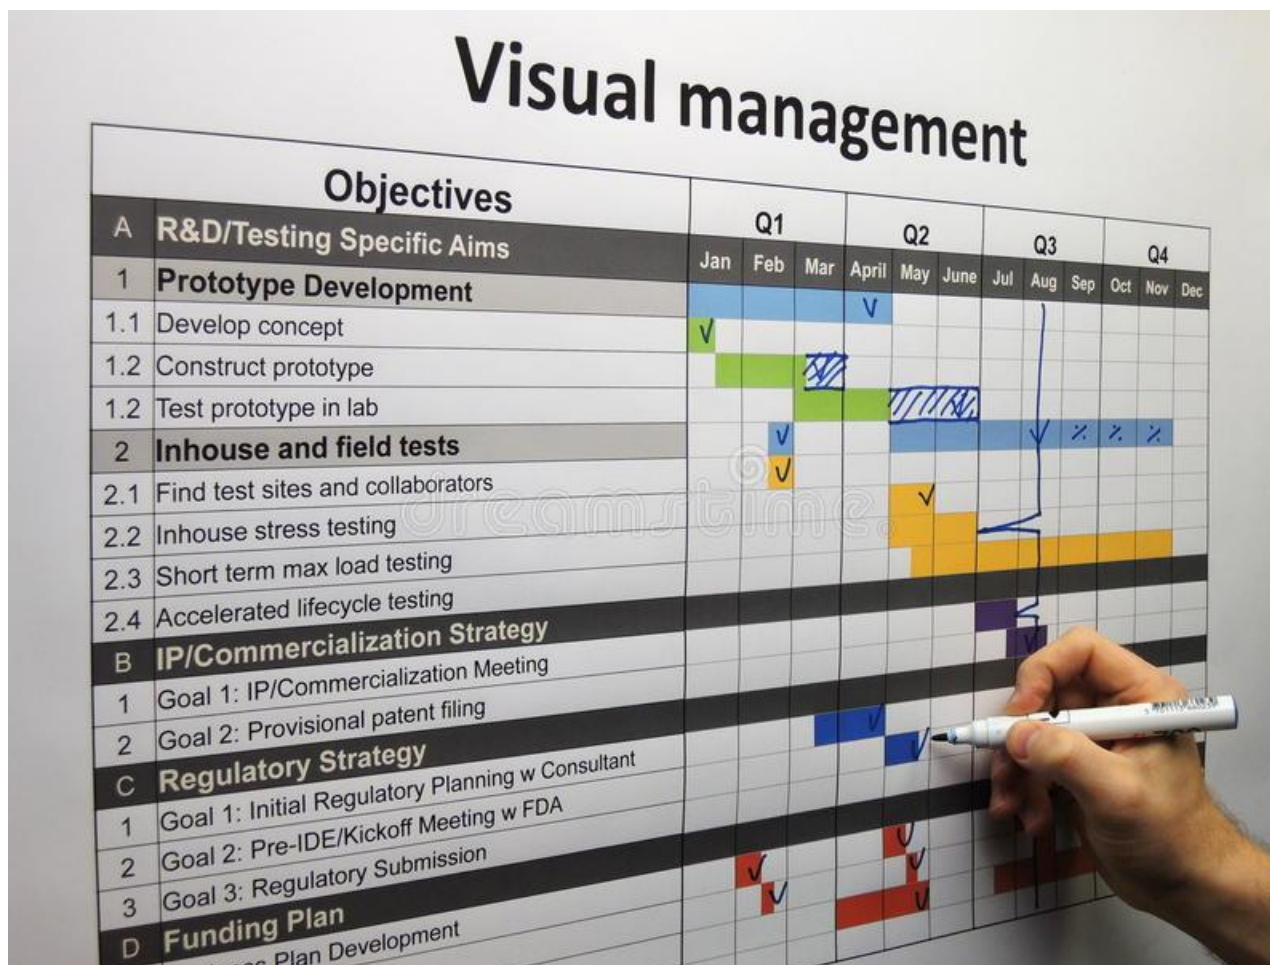

Scrivere i work package

- Un work package è una breve descrizione che specifica come i task che lo compongono saranno completati.
- I task inclusi in un work package dovrebbero avere delle relazioni tra loro che ne motivano una gestione coordinata.
- I work package permettono di aver maggior controllo sul progetto e il rispetto della schedula.
- I work package dovrebbero essere scritti per:
 - I task nel critical path;
 - I task ad alto rischio;
 - I task che richiedono risorse che sono scarse;
 - I task che hanno un'elevata varianza nella durata;
 - I task che consentono il raggiungimento di una milestone;
 - I task che condividono delle risorse;
 - etc.

Scrivere i work package


Work Package Assignment Sheet

WORK PACKAGE ASSIGNMENT SHEET		Project Name		Project No.		Project Manager	
Work Package		Schedule		Work Package Manager	Contact Information		
Number	Name	Early Start	Late Finish				
A	DESIGN	03/01/08	04/01/08	ANNA LYST			
B	PROD.EVAL	04/02/08	07/02/08	HY ROWLER			
C1	PLACE.LOCATE.PT1	04/02/08	03/04/09	SY YONARA			
C2	PLACE.LOCATE.PT2	07/03/08	03/04/09	HY ROWLER			
D	PROD.FCAST	07/03/08	03/04/09	SY YONARA			
E	PROD.DELETE	03/05/09	06/02/09	HY ROWLER			
F	PROMO.REGION	03/05/09	07/06/09	TERRITORY			
H	PRICE	08/04/09	02/05/10	HY ROWLER			
I	PLACE.DESIGN	06/05/09	08/03/10	HY ROWLER			
J	PROMO.SALES.LEAD	07/07/09	11/05/09	TERRITORY			
G	PROMO.MEDIA	07/07/09	02/05/10	SY YONARA			
K	PROMO.SALES.RPT	10/07/09	02/05/10	TERRITORY			
L	SYSTEM.TEST	02/08/10	05/10/10	ANNA LYST			
M	SYSTEM.ACCEPT	05/10/10	06/10/10	ANNA LYST			
Prepared by		Date		Approved by		Date	
						Sheet: 1 of 1	

Scrivere i work package

Work Package Description Form

WORK PACKAGE DESCRIPTION			Project Name		Project No.		Project Manager	
Work Package Name			Work Package No.		Work Package Manager			Contact Info.
Start Date		End Date		Critical Path Y N		Predecessor Work Package(s)		Successor Work Package(s)
TASK								
No.	Name	Description		Time (day s)	Responsibility		Contact Info.	
Prepared by			Date		Approved by		Date	
							Sheet 1 of 1	



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
SEDE DI CESENA

Marco A. Boschetti

C.d.S. Ingegneria e Scienze Informatiche

marco.boschetti@unibo.it

<https://www.unibo.it/sitoweb/marco.boschetti>

<http://isi-personale.csr.unibo.it/marco.boschetti>
